


OPRAVA NA DA

Záznam z jednání pracovní skupiny Společné jednání pracovní skupiny 1. a 2. dne 16. května 2019

Místo konání	Brněnské komunikace a.s., zasedací místnost v přízemí	
Začátek Konec	8,00 hod.	9,55 hod.
Přítomni	Viz prezenční listina	
Nepřítomni		
Hosté		
Termín příštích jednání	Společné jednání pracovní skupiny 1. a 2.: čtvrtek 20. 6. 2019 v 8,00 hod. na BKOM, zasedací místnost v přízemí	

Zapsala	Schválil	Rozdělovník
		

V úvodu jednání byl představen člen dozorčí rady spol. Brněnské komunikace [redacted] který požádal přítomné o odložení uzavírky Husovického tunelu o letních prázdninách. Na jednání se dostavil další člen dozorčí rady [redacted]

Všem účastníkům pracovní skupiny byla elektronicky rozeslána tabulka plánovaných akcí s žádostí o jejich aktualizaci a doplnění.

Metodika týkající se koordinační činnosti je stále v jednání. Další postup řeší SMB.

Veletrhy Brno a.s.

- pracovní skupina byla požádána o součinnost u akcí ve dnech 19.–22.3., 12.–15.5., 29.5.–1.6., 7.–11.10., kdy se předpokládá vysoká návštěvnost a frekvence vozidel.
- Průjezd vlaku po ul. Poříčí: 18.4., 5.-6.6., 15.6., 4.-14.10., 29.10.-1.11.
- beze změny

Aktuální informace k jednotlivým stavbám:

Výluka SŽDC – zabezpečovací zařízení a oba mosty

- úkol trvá
- Zábrdovický most – kvůli výluce mezi hl.n. a Židenicemi bude zajištěn průjezd tramvaje už od 30.11.2019
- opravy mostů Opuštěná, Hybešova – zúžená vozovka – do konce roku
- beze změny

SŽDC - Rekonstrukce železničních mostů

- **most nad ul. Koliště** - omezení počtu jízdnic pruhů na Kolišti bude probíhat pouze o víkendech
- **most nad ul. Lazaretní** - částečné uzavření komunikace pod mostem není možné z důvodu vedení objízdné trasy pro Zábrdovickou

SMB - Zábrdovická

- příprava DZ směrem ke Staré osadě, Bubeníčkova
- uzavírka Zábrdovické pokračuje, tramvajový provoz bude zajištěn od 30.11.2019
- uzavření Cejlu od Soudní po Vranovskou v 07-08/19 pro II. etapu Zábrdovické a souběžnou opravu TT – úplná výluka
- průjezd náhradní autobusové dopravy v období 07-08/19 zůstane zachován v trase Radlas - Plynárenská - Tkalcovská – Bratislavská – Přadlácká - Jugoslávská
- uzavírka bude rozšířena o uzavření ul. Jana Svobody, termín 06-08/19

SMB - Soubor staveb Plotní

- termín otevření ulice Dornych se posouvá na 09/19
- průjezd po ulici Zvonařka 1+1 se předpokládá do konce stavby, mění se pouze stranově.
- Od 1.9. na ul. Dornych provoz 2+2, uzavře se Plotní.

- dle sdělení DPMB nabírají vozidla MHD a IDS velká zpoždění zejména v křiž. Plotní x Zvonařka, je nutné vyvolat jednání. Po dohodě bude v této věci svoláno samostatné jednání, svolá Ing. Grund.
- od 23.5. bude předčasné užívání komunikace v rozštěpu u Svatopetrské
- opětovný požadavek na rozšíření jízdních pruhů na Zvonařce ve směru do centra, zhoršení dopravní situace pro VHD
- dle sdělení DPMB zhotovitel neakceptuje žádné změny, další jednání je naplánované na 30.5.

ŘSD – rekonstrukce mostu I/43 Brno, most ev. č. 43-002 (Hradecká - Královopolské nádraží)

- Omezení se budou dít už jen na svršku mostu
- Provoz v režimu 1+1
- realizace bude pokračovat v termínu 03/19 – 07/19
- v současnosti nabírá akce skluz 31 dnů

ŘSD – rekonstrukce mostů Otakara Ševčíka

- Stále ve stavu přípravy. Předpokládaná délka výstavby je 4 roky.
- Posunutí z roku 2019 do druhé poloviny 2020 – nutno řešit vazbu na Tomkovo náměstí
- beze změny

ŘSD – VMO Žabovřeská

- úplná uzavírka silničního mostu směr na Bystrc 30.3. – 31.8.2019
- částečná uzavírka – posuvné pracovní místo po ul. Žabovřeské 26.3. – 31.7. v rámci I. etapy
- úplná uzavírka rampy směr do města – 07-08/19 – SP není v právní moci, s úplnou uzavírkou v tomto termínu nesouhlasí DPMB a OD JMK – je reálné až po otevření silničního mostu
- objízdná trasa je vedena směrem do Bystrce ulicemi Žabovřeskou s otočením po kruhovém objezdu u Dobrovského zpět a pravým odbočením na Kníničskou, směrem z Bystrce po ulici Svratecké, Hlavní, Štursově, Kroftově, Královopolské

ŘSD – Dobrovského B

- výměna krytu vozovky za gumoasfalt u kruhového objezdu u tunelu Dobrovského
- bude provedeno po zprovoznění silničního mostu
- momentálně v přípravě, předpokládaný termín 10-11/19
- beze změny

SÚS – mosty Černovická přes Olomouckou

- dokončena 1. polovina mostu
- v roce 2018 se udělala jedna polovina (pravá ve směru do Židenic)
- zahájení prací na levé polovině 11.2.2019, částečná uzavírka do 15.7.2019
- od poloviny června do 30.9. sanace spodní stavby a podhledu NK
- od 1.8. do poloviny října úprava u AAA Auto
- dokončení prací je v plánu do 31.10., zůstává průjezd 1+1

SÚS - most na Evropské

- bude dokončeno do 30.6.2019
- dopravní omezení je řešeno instalací provizorního SSZ

- žádost o úplnou uzavírku silnice III/15289 na 1.6.-2.6. (víkend) – dle SÚS nebude realizována
- v neděli 26.5. se uskuteční dětský den na letišti Brno-Tuřany

ŘSD – VMO Tomkovo náměstí, Rokytova

- zahájení nejdříve na jaře 2020
- zatím bez stavebního povolení
- průjezd bude po celou stavbu zachován 2+2
- Bourání domu v ul. Provazníkova - přípravné práce, dopravní omezení bude ještě v tomto roce, demolici zkoordinovat s opravou Husovického tunelu

SÚS – Jihlavská

- stavba přesunuta na žádost zástupců města na rok 2020
- obrus v úseku Kamenice – Vídeňská – vzhledem k vedení objízdné trasy pro omezení na D1 v úseku Vídeňská – Bítešská tímto úsekem
- v plánu je oprava zastávky MHD na ul. Jihlavské u krematoria (investor BKOM), nutná prostorová koordinace s opravou povrchu SÚS JMK

SÚS – Černovická

- beze změny oprava povrchů – odstranění havarijního stavu
- nelze realizovat 2019 z důvodu uzavírky Dornych - Plotní
- letos se pouze zbrousí nerovnosti, v letních měsících asi lokální opravy v Komárově před mostem
- realizace celkové rekonstrukce se odhaduje v roce 2022-2023

ŘSD - Křížíkova

- oprava krytu vozovky –v realizaci
- termín 7.5 - 30.6.2019
- investor prověří možnost zkrácení termínu provádění stavebních prací v místě provizorního SSZ

ŘSD - Otakara Ševčíka

- oprava komunikace – od křižovatky s Táborskou po most Otakara Ševčíka, akce byla dvakrát posunuta kvůli koordinaci dopravy, bude se realizovat letos o prázdninách
- v plánu průjezd 1+1, zachovat odbočení na Ostravskou
- ŘSD zváží opětovné posunutí akce na příští rok z důvodu neúměrné kumulace staveb v této lokalitě (po dokončení Zábrdovické a zprůjezdnění Dornychu), přesunutím akce na příští rok by se zvýšily vícenáklady (odhad až do 1 mil. Kč)
- v současné době se připravují DIO
- byl vypracován a prezentován pentlogram s modely dopravních intenzit. Dle tohoto modelu bude realizace v 07-08/19, neboť dochází k poklesu intenzit v souvislosti s uzavřením tunelu.

ŘSD - Husovický tunel

- počítá se s úplnou uzavírkou po dobu letních prázdnin
- stavební povolení dosud není vydáno, ale předpokládá se vydání tak, aby byl dodržen termín

ŘSD - Rekonstrukce D1

- úsek Bítešská – Vídeňská
- omezení bude probíhat po etapách, posunutí termínu na 17.5.-10.11.
- uzavření nájezdu na Bítešskou v termínu 29.7.-14.9., objízdné trasy budou vedeny přes Vídeňskou, Jihlavskou, Pražskou

ŘSD – Hradecká

- souvislá oprava
- v současnosti se zpracovává dokumentace
- v plánu na rok 2021

SÚS + DPMB – Merhautova – most

- připravuje se rekonstrukce mostu přes železniční trať na rok 2021, 22 - vazba na výluky SŽDC
- nutná časová koordinace s akcí DPMB+BVK Lesnická
- zahájení prací v 09/21
- BVK prověří další související stavby

SÚS - Fryčajova

- most přes Svitavu a přes náhon, cca 100m. Zkráceno kvůli navazující stavbě, kterou chystají BVK. Plánuje se na 2020. Úsek není možné zavřít -> náročné vymýšlení objízdné trasy. Výstavba po polovinách, po celou dobu stavby bude zajištěn obousměrný provoz.
- Je třeba zkoordinovat se stavbou SÚS -> Jedovnická, při zachovaném provozu linkových bus a případných bus NAD za vlaky.
- BVK provede v koordinaci výměnu vodovodu v mostě
- zachovat provoz v režimu 1+1
- Mgr. Mudrych upozornil na související výluky SŽDC v letech 2021-2023, vedou tudy objízdné trasy VHD.

ŘSD – Bělohorská

- **most 5021** - probíhá projektová příprava, nejdříve ve 2021

ŘSD – Kývalka

- **most 23061** - zpracovává se DPS, v plánu na 2020

ŘSD – Ostravská

- **most 50002 a 50003** - v přípravě, nejdříve ve 2021

SÚS - Rakovecká

- 07/19 – 11/19 za úplné uzavírky mimo bus linky IDS JMK 303
- zatím není vysoutěžený zhotovitel, nyní probíhá výběrové řízení

SÚS - Pražská

- položení protihlukového krytu
- v úseku Jihlavská – Troubská
- v souvislosti s uzavírkou na D1 (km 190-194) je vedena objízdná trasa ulicí Pražskou, na které není možné omezit provoz

SÚS - Jedovnická

- souvislá oprava vozovky v úseku Žarošická – Velká Klajdovka v termínu 2020, včetně křižovatky se Žarošickou.
- oprava po polovinách. Po celou dobu stavby bude zajištěn provoz 1+1.

SÚS - Most Sokolova

- oprava dilatačních spar
- omezení dopravy v režimu 1+1
- omezení rychlosti na 30 km/h

SMB - Roviny

- realizace podjezdu – stavba není připravena k realizaci společně s probíhající uzavírkou Davidkovy
- bude řešeno samostatně
- dosud není vydáno SP na demolici
- beze změny

SÚS – Bělohorská

- úsek Olomoucká – Jedovnická
- termín 07-08/20
- OD MMB prověří stav podané žádosti o stavební povolení

BKOM - Lipová

- úsek Hlinky – Květná, souvislá údržba vozovky
- posunutí termínu opravy na 24.6.-10.7.
- doprava řešena jednosměrným provozem

BKOM - Údolní I.

- nyní se zpracovává DÚR, v plánu nejdřív na rok 2021
- beze změny

Teplárny Brno

- **Poříčí a Polní** - připravuje se stavba s realizací 11/19 – 09/20. Práce budou zahájeny ještě v tomto roce uzavřením jednoho jízdního pruhu pro práce v korytě řeky. Překop Poříčí po třetinách v roce 2020.
- respektování průjezdu vlaku BVV
- BKOM žádá o dodání předběžného harmonogramu prací
- od jara 2020 se připravuje oprava kanalizace (BVK) – bezvýkopově pouze s lokálními zásahy a omezením průjezdu

- **Cejl** – stavba zahájila v úseku Radlas – Francouzská v 03/19 uzavírkou směru z centra.
- **Mlýnská** - realizaci posunout až po dokončení Plotní
- **Masná, Zderadova** - je v plánu na rok 2020 – nutno zpracovat dopravní řešení a přechod Hladíkovy řešit bezvýkopově
- **Lazaretní** – koordinace s BVK, akce začne po zprovoznění Zábrdovické
- **Soudní a část Bratislavské** - v plánu na rok 2020

Dopravní podnik města Brna

- **Cejl II** – 07–08/19, úvratí TT u ulice Soudní, uzavírka v úseku Soudní - Vranovská
- Oprava TT **Bubeníčková** – realizace 07-08/19, s využitím úplné výluky tramvajové dopravy pro stavbu Zábrdovická, BKOM připravuje realizaci předjízdových pruhů, zahájení je v plánu od 29.6., provoz zajištěn 1+1, příjezd k prodejně Kaufland zachován
- **Minská** v úseku Chládkova-Tábor – pouze víkendová výluka, v plánu na podzim 2019
- **Křenová** – oprava TT, termín 04-05/19, 2-3 víkendy (pouze So+Ne), 1. část je již hotová. V plánu je více lokálních oprav v 09/19 (pouze víkendy)
- **Veveří** – od Gorkého po Žerotínovo náměstí (částečná výluka) - posun akce na 2020, BKOM bude realizovat předjízdové pruhy. Oblouk v Žerotínově nám. - zkoordinovat s akcemi BVK (Brandlova)
- Oprava TT **Zábrdovická** – využití stavby mostu a výluky tramvajové dopravy k opravě navazujícího úseku (úsek ve směru od Vojenské nemocnice na Starou Osadu)
- TT **Jedovnická** – samostatné těleso bez omezení dopravy
- KT **Ostravská** – samostatné těleso bez omezení dopravy, vjezd (výjezd) do ul. Ostravské
- Smyčka **Komárov** - samostatné těleso bez omezení dopravy
- **Novolíšeňská** – Jírova, prodloužení trolejbusové tratě – stavba probíhá
- **Merhautova I a II** – realizace léto 06-09/2020 – dle požadavku MČ bude asi realizováno společně za zjednodušení tratě – délka výstavby asi 4 měsíce
- **Lesnická** – realizace společně s BVK nejdříve podzim 2020, výluka tramvajové tratě je možná pouze v období 06-08 každého roku. DPMB požaduje po dobu akademického roku zachování ponechání je nezbytný jednokolejného provozu pro cestující MHD. Zvažuje se varianta realizace na 2 roky, realizovat o prázdninách po půlkách; nutná časová koordinace s mostem Merhautova
- **Lidická** - Street Party k výročí 150 let MHD, termín 31. 8. 2019 (sobota odpoledne)
- **Netroufalky** – prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu – připravuje se. Stavba začne v 08/19. Po dobu 3 měsíců od 2. poloviny 2020 provoz v Jihlavské v režimu 1+1.
- **Nové Sady** - omezení dopravy, režim 1+1, v plánu 2020

Brněnské vodárny a kanalizace

- akce (Lesnická, Provazníkova, Okružní, Drobného) koordinovat s DPMB (Merhautova) a ŘSD (Tomkovo nám.)
- **Lužánecká** - zahájení od 3. 6. 2019, uzavírka na 12 měsíců
- **Králova** – dokončení akce z loňského roku je v plánu do 8/19, oprava křiž. Mučednická x Králova
- **Gajdošova** - zatím se oprava odkládá, komplikovaná jednání s vlastníky dotčených pozemků
- **Bohunická** - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v úseku Vídeňská – Řehákova – stavba zahájí po zprovoznění Dornychu a ukončení omezení na D1, délka opravy se předpokládá na 14 měsíců, v plánu od 09/19 03/2020. Ve všech etapách (mimo opravu povrchů) se počítá se zachováním vjezdů/výjezdů na Vídeňskou.

- **Veselá, Solniční** - nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, v plánu zahájení na podzim 2019, koordinovat s Teplárnami a GasNet

Technické sítě Brno

- **Ostravská** - letos budou realizovat Technické sítě Brno dokončení VO a v termínu cca 04/19 – 06/19. Omezený režim v úseku Olomoucká-Černovická, termín ukončení do 30.6., TSB prověří zkrácení délky prací. Další úsek je v plánu 07-08/19.
- **Vídeňská** - rekonstrukce VO v úseku Jihlavská - Heršpická – D1 v termínu 07/19 – 11/19 - 1. část při zachování průjezdu ve všech jízdnicích pruzích. V příštím roce bude dokončena 2. část, která vyžaduje omezení průjezdu, podle koordinace s dalšími stavbami.

Ostatní

Terminál Holzova (Starý Lískovec) -> ulevil by dopravě, mohly by tam být ukončené některé autobusové linky. Momentálně je třeba najít vhodné místo. Beze změny.

Masarykova univerzita – Kamenice

- stavba dvoupatrového objektu nad komunikací
- žádost o úplnou uzavírku v termínu 7/19 - 01/20, průjezd povolen pouze pro IZS
- s ohledem na navržený průjezd vozidel IZS vznesl Mgr. Mudrych dotaz týkající se zakázaného vjezdu vozidel VHD
- dopravní značení projektuje DOKA s.r.o.
- komise nesouhlasí s úplnou uzavírkou (povolení až po skončení uzavírky na D1; - nutná koordinace s omezením II/602 při výstavbě tramvaje na Kampus)

GasNet - Gajdošova

- částečná uzavírka v termínu 1.7.-21.7.
- rekonstrukce plynovodu v úseku u kostela sv. Cyrila a Metoděje

Další akce, které jsou zařazeny v rozpočtu SMB:

(realnost a stav přípravy prověří OD MMB, případně OI MMB)

- Benešova - plán na 2021, je nereálné
- Bratislavská - plán na 2022/2023
- Cejl II. - bude se zadávat projektová dokumentace, plán na 2025
- Dukelská, Dačického - žádné informace
- Křenová (úsek Vlhká-Zderadův most) - plán na 2022
- Merhautova - žádné informace
- Štefánikova - plán na 2021
- Údolní I. - plán na 2021
- Veveří I. - územní rozhodnutí by mělo být dokončeno, plán na 2025
- Vídeňská (úsek Poříčí-Celní) - v přípravě

- Mendlovo nám. – žádné informace
- Požární, V rejích - žádné informace
- Východní obchvaty: Slatina, Tuřany, Žebětín - žádné informace
- Terminál Starý Lískovec - žádné informace
- Prodloužení TT Kamechy - zpracovává se projektová dokumentace
- Optimalizace zastávek - žádné informace
- Rosického nám., Sochorova – žádné informace
- Zastávka MZK - žádné informace
- parkoviště Přemyslovo nám. - žádné informace
- parkování Halasovo nám. - žádné informace
- Dostavba kanalizace v Brně – nutno specifikovat

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:
SÚS JMK, oblast Střed
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Specializované pracoviště dopravního
inženýrství
Brno-město a Brno-venkov
Kounicova 24
611 32 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka
/2019/LiCu

Vyřizuje /linka

V Brně dne
2.7.2019

Věc: žádost o stanovisko k umístění dopravního zařízení


Žádáme Vás o stanovisko ke stanovení dopravního značení dle přiložené projektové dokumentace. Důvodem je zabránění tranzitní dopravy nad 12 t po silnici II/602 v úseku Brno, Svážná – Kývalka. Předchozí stanovisko bylo vydáno pod č. j.: KRPB-275767-1/ČJ-2018-0600DP-TICH.

S pozdravem

Policie ČR	
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje	
Došlo:	10.07.2019
V.....	podá

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 2581 (24)

ústavná k podmínke 1

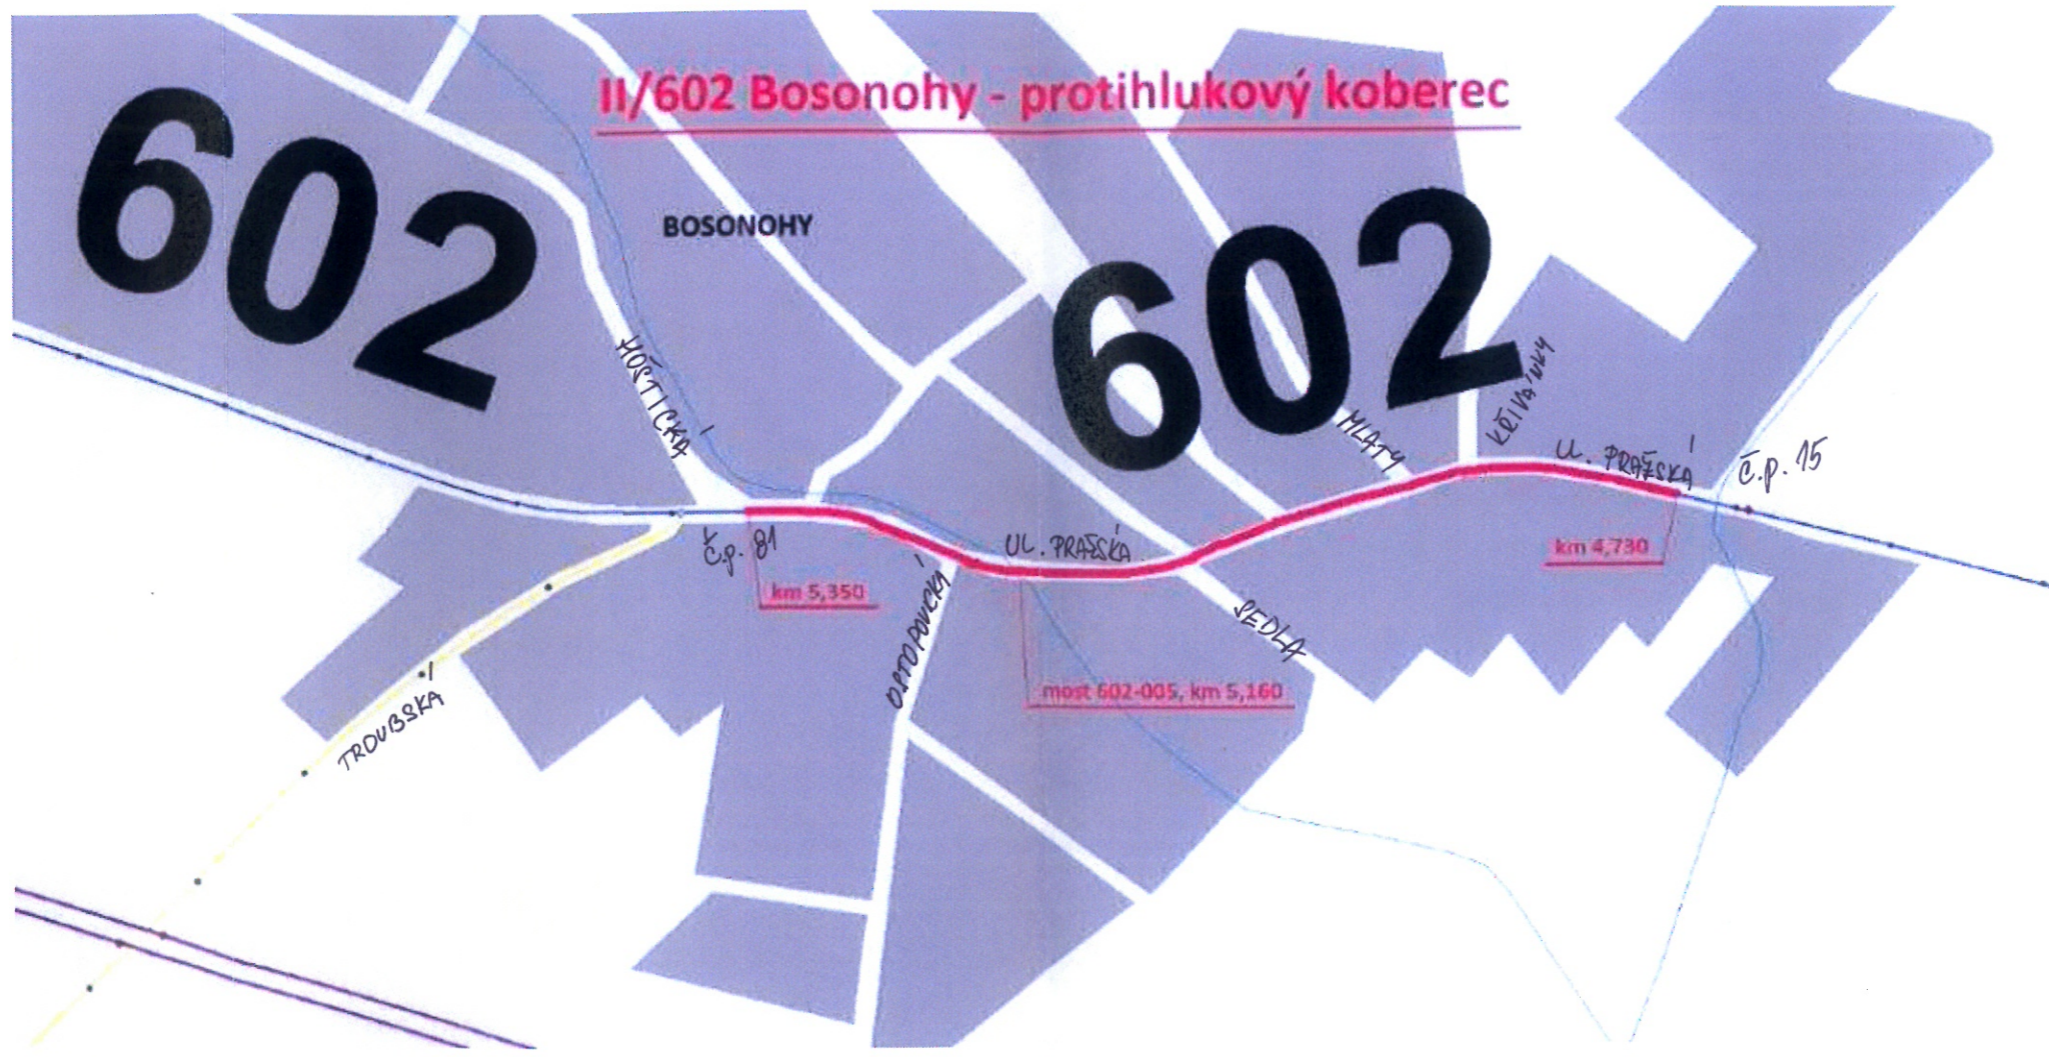

POKLADKA TICHÉHO KOBERCE

II/602 Brno - Bosonohy č.p. 15 - č.p. 81

STRABAG a. s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
OBLAST JIH

TOVÁRNÍ 3
620 00 BRNO / ČR

DIČ : CZ60838744
IČ : 60838744
Tel. : [REDACTED]
Fax : ++420 / 545 22 94 57
Bank.spoj.: [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

STRABAG

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oddělení oprav dálnic Morava
[REDACTED]

V Brně dne 15. dubna 2019

D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5 - 193,8 vpravo a vlevo

Prohlašujeme, že pro provedení výše uvedené stavby jsme strojně, materiálově a personálně zabezpečeni.

Zodpovědný pracovník zhotovitele:

[REDACTED]
[REDACTED] (vedoucí PJ Chrlice)

adresa pracoviště: STRABAG a. s., odštepny závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00



STRABAG

STRABAG a. s.
odštepny závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

D1 REKONSTRUKCE VOZOVKY KM 189.530 - 193.800 VPRAVO I VLEVO
ETAPIZACE VÝSTAVBY

Termín	Název SO - prováděné práce	Doba trvání ve dnech	Etapa I 31 dní	Etapa II 43 dní	Etapa III 56 dní	Etapa IV 30 dní	Etapa V 23 dní	
	Dálnice D1 km 189.530 - 193.800	182						
11.5. - 12.5.	Montáž provizorních betonových svodidel a PDZ	2	11.-12.5.					
13.5. - 10.6.	Rychlý jízdní pruh pravého jízdního pásu	29	13.5. - 10.6.					
11.6. - 23.7.	Pomalý jízdní pruh pravého jízdního pásu	43		11.6. - 23.7.				
	Uzavřeny rampy							
24.7. - 25.7.	Přesun provizorních betonových svodidel a PDZ	2			24.-25.7.			
22.7. - 12.9.	Pomalý jízdní pruh levého jízdního pásu	53				25.7. - 16.9.		
	Uzavřena rampy							
	Uzavřena CSPHM OMV							
13.9. - 11.10.	Rychlý jízdní pruh levého jízdního pásu	30					17.9. - 15.10.	
12.10. - 6.11.	Práce v SDP + dokončovací práce	23						16.10. - 6.11.
9.11. - 10.11.	Likvidace provizorních betonových svodidel a PDZ							9.-10.11.

V Brně dne: 15.4.2019



